

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

BẢN TIN TUẦN

Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên các lưu vực sông khu vực Miền núi phía Bắc - Phục vụ đảm bảo an toàn công trình năm 2021
Hồ chứa Nậm Ngam – Tỉnh Điện Biên

(Từ ngày 27/08/2021-02/09/2021)

I. Lượng mưa, dòng chảy đến hồ hiện tại và dự báo.


1.1. Tổng hợp lượng mưa hiện trạng, dự báo mưa tại các trạm:

TT	Trạm	X _{tuần trước} (18/8-25/8) (mm)	Tổng X từ 1/1-18/8) (mm)	So với các năm trước (+/- (%))			Dự báo X _{tuần tới} (27/8- 2/9) (mm)
				TBNN	2020	2019	
1	Điện Biên	26,0	1173,9	+4	+4	+20	31.3
2	Nà Tấu	30,4	1273,2		-7	+109	49.5
Trung bình		28,2	1223,6	3,9	-1,5	64,2	40,4

1.2. Dự báo lượng mưa và dòng chảy đến hồ:

TT	Ngày	X (mm)	Q _{bq} ngày (m ³ /s)	Q _{max} ngày (m ³ /s)	Nhận định
	Tổng	49,54	0,50	1,13	Có mưa vừa
1	27/08	3,2	0,41	0,51	Có mưa nhỏ
2	28/08	1,5	0,32	0,34	Có mưa nhỏ
3	29/08	0,7	0,28	0,30	Có mưa nhỏ
4	30/08	2,5	0,22	0,25	Có mưa nhỏ
5	31/08	11,2	0,24	0,34	Có mưa
6	02/09	19,5	0,98	1,12	Có mưa vừa
7	03/09	10,9	1,09	1,13	Có mưa

1.3. Biểu đồ dự báo lượng mưa và dòng chảy đến hồ giai đoạn từ 27/8-2/9/2021

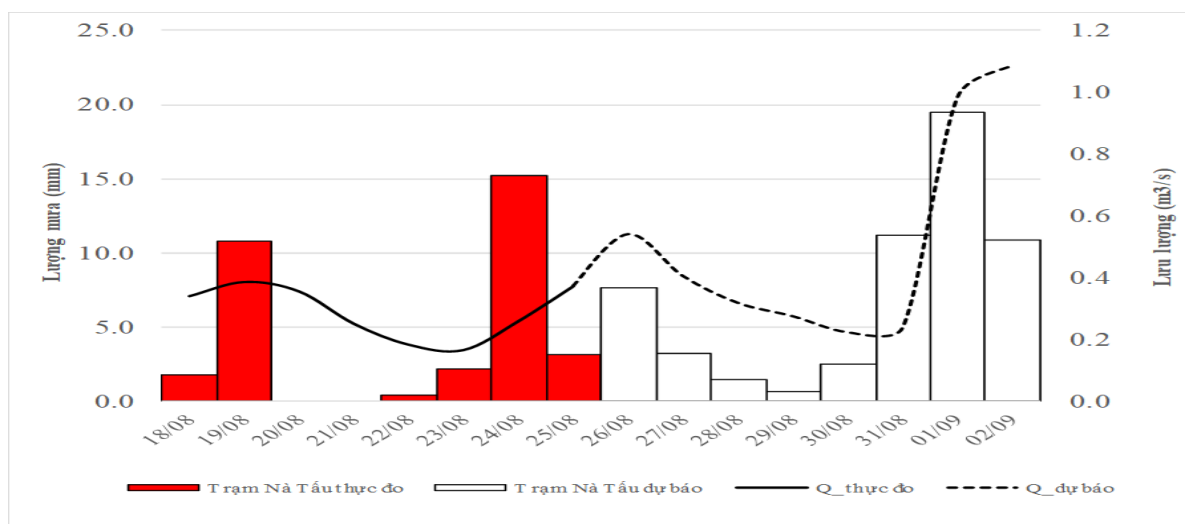


II. Dự báo vận hành hồ, tuần từ 27/08 đến 02/09/2021.

2.1. Tính toán vận hành hồ theo dự báo nguồn nước đến:

Tuần	Ngày	Q _{đến} (m ³ /s)		Q _{qua công} (m ³ /s)	Z _{hồ} (m)	Z _{hồ} - Z _{hồmax} (+/-)	W _{hồ} (10 ⁶ m ³)	Tỉ lệ W (%)	Q _{xả max} (m ³ /s)	Thực tế/ khuyến cáo vận hành
		TB (24 giờ)	Max							
Tuần trước (Thực đo)	20/08	0,36	0,42	0,652	1.132,89	-7,77	2,34	39,4	0,00	Tích nước
	21/08	0,25	0,30	0,579	1.132,82	-7,84	2,31	38,9	0,00	Tích nước
	22/08	0,18	0,21	0,579	1.132,78	-7,88	2,30	38,7	0,00	Tích nước
	23/08	0,16	0,17	0	1.132,75	-7,91	2,29	38,6	0,00	Tích nước
	24/08	0,26	0,41	0,166	1.132,65	-8,01	2,25	37,9	0,00	Tích nước
	25/08	0,37	0,41	0,579	1.132,57	-8,09	2,22	37,4	0,00	Tích nước
	26/08	0,54	0,63	0,014	1.132,43	-8,23	2,16	36,4	0,00	Tích nước
Tuần tới (Dự báo)	26/08	0,41	0,51	0,445	1.132,51	-8,15	2,19	37,0	0,00	Tích nước
	27/08	0,32	0,34	0,506	1.132,57	-8,09	2,22	37,4	0,00	Tích nước
	28/08	0,28	0,30	0,561	1.132,64	-8,02	2,24	37,8	0,00	Tích nước
	29/08	0,22	0,25	0,452	1.132,68	-7,98	2,26	38,1	0,00	Tích nước
	30/08	0,24	0,34	0	1.132,73	-7,93	2,28	38,4	0,00	Tích nước
	01/09	0,98	1,12	0	1.132,94	-7,72	2,36	39,8	0,00	Tích nước
	02/09	1,09	1,13	0,153	1.133,18	-7,48	2,46	41,3	0,00	Tích nước

2.2. Biểu đồ vận hành tích, xả nước hồ dự báo:

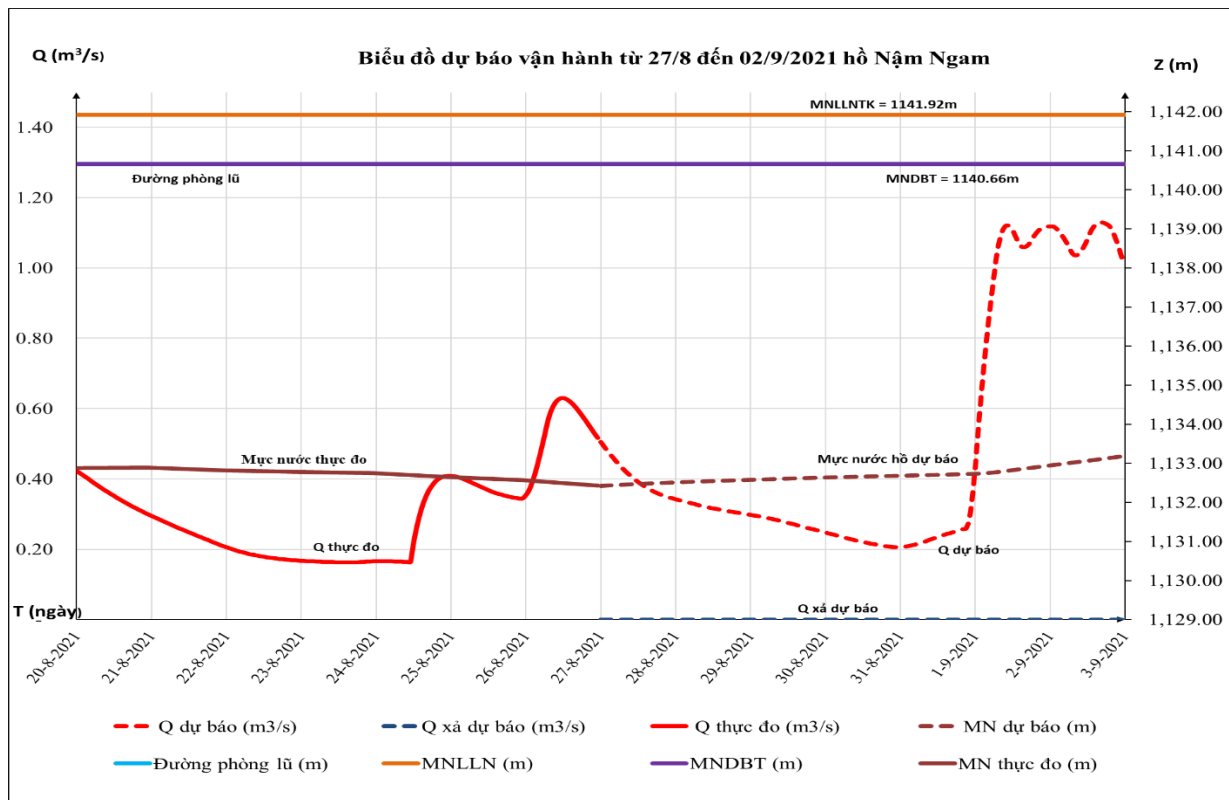

Dự báo trong tuần từ 27/8-2/9, dòng chảy đến hồ có xu hướng giảm nhẹ rồi lại tăng vọt về cuối tuần, lưu lượng đến lớn nhất vào ngày 2/9 với Q_{đếnmax} = 1,13 m³/s, hồ tiếp tục tích nước.

2.3. Đánh giá khả năng mức độ ngập khu vực hạ du:

Khu vực ảnh hưởng	Khả năng, mức độ ngập úng				Các địa điểm có nguy cơ bị ảnh hưởng (xã)
	Không ngập	Nhẹ	Trung bình	Nặng	
H. Điện Biên Đông	x				Pú Nhi, Noong U
Huyện Điện Biên	x				Núa Ngam

III. Kết luận

+ *Tình hình nguồn nước hồ:*

- Tổng lượng mưa thực đo trong tuần từ 18/8/2021 đến 7 giờ, ngày 25/8/2021 trong vùng phổ biến từ 25 - 30 mm.

- Tổng lượng mưa trong vùng từ ngày 1/1 đến ngày 25/8/2021 trong vùng phổ biến từ 1101 - 1285 mm. Riêng tại trạm Nà Tàu là 1273 mm. Và trạm Điện Biên là 1174 mm

+ *Dự báo trong tuần tới:* Dự báo tuần từ 27/08-02/09 trong vùng có khả năng Có mưa vừa với lượng phổ biến từ 1-20, mưa vừa mưa to có khả năng xuất hiện vào ngày 01/09

+ *Dự báo vận hành hồ:* trong tuần tới hồ vẫn tiếp tục tích nước

+ *Khả năng ngập hạ du:* vùng hạ du hồ không có khả năng ngập lụt.

Bản tin tuần tiếp theo sẽ được phát hành vào ngày 02/09/2021.

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI
